
№	Имя мероприятия	Начало (день от старта)	Длительность (нидель)	Дата начала	Дата окончания	Исполнители
1	Анализ требований заказчика	0	1	01.09.2026	07.09.2026	Аналитик, Менеджер проекта
2	Разработка технического задания	7	1	08.09.2026	14.09.2026	Аналитик, Заказчик
3	Проектирование архитектуры системы	14	2	15.09.2026	28.09.2026	Архитектор, Системный аналитик
4	Разработка базы данных	28	2	29.09.2026	12.10.2026	Разработчик БД
5	Разработка серверной части (API)	35	4	06.10.2026	03.11.2026	Backend-разработчик
6	Разработка десктоп-приложения (C++)	49	6	20.10.2026	30.12.2026	C++ разработчик
7	Разработка мобильного приложения (Android)	49	6	20.10.2026	30.12.2026	Android-разработчик
8	Интеграция компонентов системы	77	2	17.11.2026	30.11.2026	Команда разработки
9	Разработка пользовательской документации	63	3	03.11.2026	23.11.2026	Технический писатель
10	Внутреннее тестирование (альфа)	91	2	01.12.2026	14.12.2026	QA-инженер
11	Исправление ошибок и доработка	105	2	15.12.2026	28.12.2026	Команда разработки
12	Пилотное внедрение на предприятии	119	2	29.12.2026	11.01.2027	Менеджер проекта, Заказчик
13	Обучение персонала заказчика	133	1	12.01.2027	18.01.2027	Технический писатель
14	Приемочное тестирование (бета)	140	2	19.01.2027	01.02.2027	QA-инженер, Заказчик
15	Сдача проекта и передача в эксплуатацию	154	1	02.02.2027	08.02.2027	Менеджер проекта



	A	B	C	D	E	F
1	**Мероприятие**	**Начало (день от старта)**	**Длительность (дней)**	**Дата начала**	**Дата окончания**	**Исполнители**
2	Анализ требований заказчика	0	7	01.09.2026	07.09.2026	Аналитик, Менеджер проекта
3	Разработка технического задания	7	7	08.09.2026	14.09.2026	Аналитик, Заказчик
4	Проектирование архитектуры системы	14	14	15.09.2026	28.09.2026	Архитектор, Системный аналитик
5	Разработка базы данных	28	14	29.09.2026	12.10.2026	Разработчик БД
6	Разработка серверной части (API)	35	28	06.10.2026	03.11.2026	Backend-разработчик
7	Разработка десктоп-приложения (C++)	49	42	20.10.2026	30.12.2026	C++ разработчик
8	Разработка мобильного приложения (Android)	49	42	20.10.2026	30.12.2026	Android-разработчик
9	Интеграция компонентов системы	77	14	17.11.2026	30.11.2026	Команда разработки
10	Разработка пользовательской документации	63	21	03.11.2026	23.11.2026	Технический писатель
11	Внутреннее тестирование (альфа)	91	14	01.12.2026	14.12.2026	QA-инженер
12	Исправление ошибок и доработка	105	14	15.12.2026	28.12.2026	Команда разработки
13	Пилотное внедрение на предприятии	119	14	29.12.2026	11.01.2027	Менеджер проекта, Заказчик
14	Обучение персонала заказчика	133	7	12.01.2027	18.01.2027	Технический писатель
15	Приемочное тестирование (бета)	140	14	19.01.2027	01.02.2027	QA-инженер, Заказчик
16	Сдача проекта и передача в эксплуатацию	154	7	02.02.2027	08.02.2027	Менеджер проекта
17						

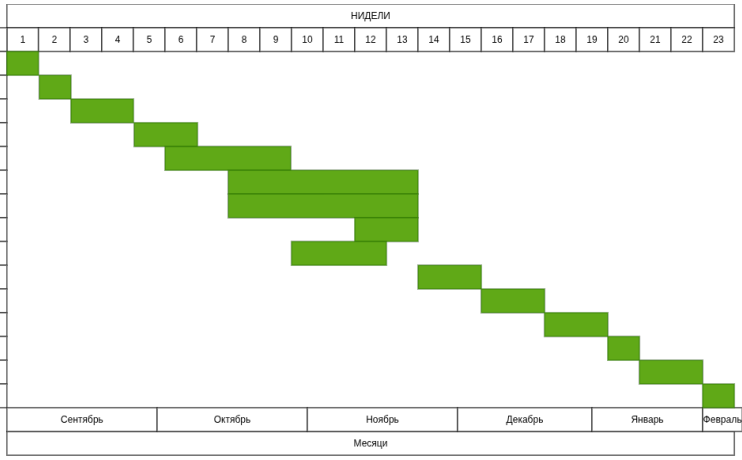
